

OGGETTO

PR FESR 2021-27 Obiettivo Specifico RSO4.2

Azione 4.2.1 - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa - Avviso pubblico di cui al D.D. n. 109 del 30/04/2024

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia del Comprensivo De Roberto di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria - CUP: H19B24000210002

COMMITTENTE



Istituto Comprensivo Statale
"Federico De Roberto"

Piazzale Tienanmen, 5
95019 Zafferana Etnea
tel. 095.7093023
C.F. 92020820889
Cod. Univ. Uff. UFE9R9
ctic860001@istruzione.it
ctic860001@pec.istruzione.it

PROGETTISTA



marco tilaro
architetto

STUDIO DI ARCHITETTURA
via Pergusa, 102 - Enna
TEL./FAX +39.0935.546750
PARTITA IVA 00609210869
architetto.tilaro@gmail.com
architetto.tilaro@pec.it

Albo Architetti P.P.C. di Enna
iscriz. n° 126 da Marzo 1993

NOME ELABORATO

Cronoprogramma dei lavori

TAVOLA

E.04

SCALA

- - -

DATA EMISSIONE


10/07/2026

PROGETTAZIONE

esecutiva

FIRME

RIF. IMMAGINE

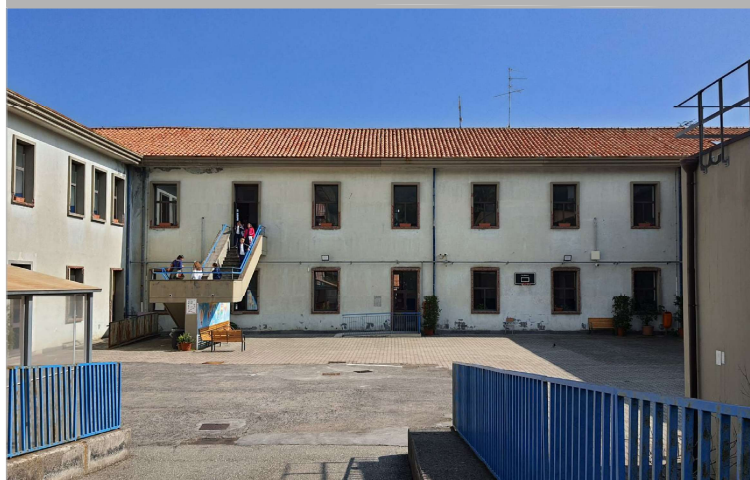

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

Cronoprogramma lavori



Indice

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Pag. 5
TEMPI DI ESECUZIONE	Pag. 6
PRODUZIONE	Pag. 7
EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO	Pag. 8
GRAFICO ANDAMENTO DEI LAVORI	Pag. 8

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

d.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art.30 dell' allegato I.7 al d.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è parte integrante del progetto esecutivo.

Il cronoprogramma è costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

Per la fase di esecuzione dei lavori, inoltre, consente di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle eventuali anticipazioni dovute all'affidatario, in concomitanza degli stadi di avanzamento fissati dal capitolato speciale d'appalto: gli importi fissati nel capitolato speciale d'appalto per il pagamento di acconti all'esecutore corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l'opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini fissati dal capitolato speciale d'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 dell'allegato I.7 al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e delle indicazioni di cui capitolato speciale d'appalto, l'esecutore deve presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, sarà compito del Direttore dei Lavori curare l'aggiornamento del Cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori, anche tramite gli assistenti con funzioni di direttori operativi, che avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e proponendo i necessari interventi correttivi.

TEMPI DI ESECUZIONE

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (**NGC**) di ogni attività, sono stati messi in relazione i singoli importi con la produzione media della manodopera in funzione della condizione climatica.

NGC = NGL x Ci

Avendo indicato con
NGC = numero di giorni consecutivi necessari
NGL = numero di giorni lavorativi utili
Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico ambientale)

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Avendo indicato con:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliere
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

$$NGL = (I \times P / 100) / (C \times N \times O)$$

I valori relativi a “percentuale manodopera” e “numero addetti”, per ogni attività lavorativa, saranno visibili direttamente dal cronoprogramma allegato.

2.0 Determinazione del coefficiente “Ci”

A seconda delle condizioni ipotizzate si avrà una produzione variabile tra il 15% ed il 90% rispetto alla produzione ottimale, in considerazione dell'andamento climatico stagionale e delle festività.

Tenendo conto, inoltre, che in fase di progetto non è possibile conoscere quale sarà l'effettiva data di inizio dei lavori, è possibile tenere in considerazione le prevedibili incidenze dei giorni di **andamento sfavorevole** come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno, con aumento temporale analogo di ogni attività lavorativa, indipendentemente dalla successione temporale.

Condizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82,5
Normale	15	15	90	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	90	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58,75

Per ogni mese dell'anno sono riportate le percentuali rispetto alle condizioni ottimali. L'ultima colonna rappresenta il valore medio relativo alle diverse condizioni ipotizzate. In base a tali valori medi annui, è possibile ricavare altrettanti coefficienti (Ci):

Coefficienti “Ci”	Classe climatica
$100 / 82,5 = 1,21$	A1 - Favorevole
$100 / 65 = 1,54$	A2 - Normale
$100 / 58,75 = 1,7$	A3 - Sfavorevole

PRODUZIONE

Dai calcoli eseguiti, risulta che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 100,00 giorni naturali e consecutivi.

Considerando che il totale dei lavori ammonta a **201.924,16 €**

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 (2026) - Importo: **201.924,16 €**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di circa **60.173,35 €**

EMISSIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO

Secondo i termini fissati nel Capitolato Speciale di Appalto, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle rate secondo gli importi maturati ai rispettivi S.A.L.

In particolare si prevede di emettere i SAL ogni qualvolta l'importo maturato dalle lavorazioni abbia superato il limite di euro 30.000,00.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

Attività lavorative		Importo	Quantità	%MO	O	Inizio - Fine	Durata
1	ESECUZIONE LAVORI						
2	LAYOUT 1						
3	Allestimento cantiere	3.200,00 €	0,00	45,27%	4	01/09/2026 - 02/09/2026	2
4	A.P.07 Rimozione di pavimentazione interna ed esterna rto e smaltimento presso discariche autorizzate.	152,80 €	16,36	45,27%	4	03/09/2026 - 04/09/2026	2
5	A.P.05 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi one di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	176,00 €	50,00	45,27%	4	03/09/2026 - 04/09/2026	2
6	A.P.07 Rimozione di pavimentazione interna ed esterna rto e smaltimento presso discariche autorizzate.	623,73 €	66,78	45,27%	4	03/09/2026 - 05/09/2026	3
7	A.P.15 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti, c.....a rifiuto, quest'ultimo compensato a parte.	4.000,00 €	514,75	45,27%	4	07/09/2026 - 12/09/2026	6
8	SIC24_21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	4.093,20 €	105,74	45,27%	4	14/09/2026 - 16/09/2026	3
9	SIC24_02.01.03 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo.....di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	39,86 €	0,12	45,27%	4	17/09/2026 - 17/09/2026	1
10	SIC24_09.01.07 Intonaco civile per esterni dello spessore comp..... il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	24,96 €	0,90	45,27%	4	18/09/2026 - 19/09/2026	2
11	SIC24_09.01.10.002 Strato di finitura per esterni su superfici già..... a perfetta regola d'arte. nei colori forti	36,01 €	0,90	45,27%	4	21/09/2026 - 22/09/2026	2
12	A.P.10 Fornitura e posa in opera di chiusino con telai.....e il chiusino posto in opera. Misure cm 40x40x8.	1.678,80 €	10,00	45,27%	4	23/09/2026 - 24/09/2026	2
13	A.P.29 Fornitura e collocazione di profilo in PVC, fle.....e la posa; andamento curvilineo. Di altezza 60 mm.	716,87 €	24,50	45,27%	4	28/09/2026 - 29/09/2026	2
14	A.P.16 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vi.....ulometria controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.	14.116,17 €	298,07	45,27%	4	30/09/2026 - 09/10/2026	10
15	Modifica recinzione di cantiere					10/10/2026 - 10/10/2026	1
16	LAYOUT 2						
17	Allestimento cantiere	220,00 €	0,00	45,27%	4	10/10/2026 - 10/10/2026	1
18	SIC24_21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni.....one di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	80,21 €	6,85	45,27%	4	12/10/2026 - 13/10/2026	2
19	SIC24_21.01.02.001 Demolizione di calcestruzzo di cemento non arma..... mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	7.192,28 €	18,20	45,27%	4	12/10/2026 - 17/10/2026	6
20	Rimozione di pavimentazione in autobloccanti, c.....a rifiuto, quest'ultimo compensato a parte.	1.000,22 €	0,00	45,27%	4	14/10/2026 - 14/10/2026	1
21	A.P.23 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi t.....er chiusino in ghisa sino a dimensioni 60x60 cm.	84,18 €	2,00	45,27%	4	14/10/2026 - 14/10/2026	1
22	A.P.22 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi t.....er chiusino in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.	105,24 €	3,00	45,27%	4	14/10/2026 - 14/10/2026	1
23	SIC24_21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	410,33 €	10,60	45,27%	4	15/10/2026 - 17/10/2026	3

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

	Attività lavorative	Importo	Quantità	%MO	O	Inizio - Fine	Durata
24	A.P.11 Fornitura e posa in opera di chiusino con telai.....il chiusino posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.	912,96 €	6,00	45,27%	4	19/10/2026 - 19/10/2026	1
25	A.P.10 Fornitura e posa in opera di chiusino con telai.....e il chiusino posto in opera. Misure cm 40x40x8.	671,52 €	4,00	45,27%	4	19/10/2026 - 19/10/2026	1
26	SIC24_03.02.04 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio.....teriali previste dalle norme vigenti in materia.	1.163,28 €	335,24	45,27%	4	20/10/2026 - 20/10/2026	1
27	SIC24_03.01.18 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base ano giunti - Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa	5.956,50 €	20,62	45,27%	4	21/10/2026 - 22/10/2026	2
28	SIC24_05.01.10.002 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in co.....s;arte. collocato all'esterno degli edifici	1.081,33 €	64,25	45,27%	4	23/10/2026 - 25/10/2026	3
29	Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vi.....ulometria controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.	4.000,00 €	100,00	45,27%	4	26/10/2026 - 29/10/2026	4
30	A.P.12 Fornitura e posa in opera di chiusino con telai.....re il chiusino posto in opera. Misure cm 60x6x8.	889,95 €	5,00	45,27%	4	26/10/2026 - 27/10/2026	2
31	A.P.02 Fornitura e posa in opera di profili in allumin.....amento rettilineo e per altezza di sino a 20 mm.	2.404,90 €	115,62	45,27%	4	28/10/2026 - 31/10/2026	4
32	A.P.03 Fornitura e posa in opera di profili in allumin.....amento curvilineo e per altezza di sino a 20 mm.	585,75 €	24,57	45,27%	4	28/10/2026 - 29/10/2026	2
33	A.P.04 Fornitura e posa in opera di pavimentazione dec..... a scelta insindacabile del direttore dei lavori.	54.094,70 €	357,58	45,27%	4	02/11/2026 - 12/11/2026	11
34	A.P.06 Fornitura e posa in opera di pavimento antitrau.....er dare il lavoro completo a regola d'arte.	5.565,98 €	64,25	45,27%	4	12/11/2026 - 13/11/2026	2
35	SIC24_11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,.....l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	1.004,97 €	43,43	45,27%	4	26/10/2026 - 27/10/2026	2
36	SIC24_21.01.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, g.....fiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	251,10 €	30,00	45,27%	4	26/10/2026 - 26/10/2026	1
37	SIC24_02.01.03 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo.....di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	435,13 €	1,31	45,27%	4	27/10/2026 - 28/10/2026	2
38	SIC24_09.01.07 Intonaco civile per esterni dello spessore comp..... il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	265,38 €	9,57	45,27%	4	29/10/2026 - 30/10/2026	2
39	SIC24_09.01.10.002 Strato di finitura per esterni su superfici già..... a perfetta regola d'arte. nei colori forti	382,90 €	9,57	45,27%	4	02/11/2026 - 03/11/2026	2
40	SIC24_10.01.05 Fornitura e collocazione di lastra di pietra la.....os; opera completa a perfetta regola d'arte.	1.074,93 €	7,75	45,27%	4	04/11/2026 - 05/11/2026	2
41	A.P.13 Fornitura e posa in opera di recinzione modular.....d'arte per altezza recinzione pari a 150 cm	4.938,40 €	20,00	45,27%	4	06/11/2026 - 12/11/2026	7
42	SIC24_11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,.....l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	3.533,02 €	152,68	45,27%	4	09/11/2026 - 13/11/2026	5
43	Modifica recinzione di cantiere					02/11/2026 - 02/11/2026	1
44	LAYOUT 2						
45	Allestimento cantiere	0,00 €	0,00	45,27%	4	02/11/2026 - 02/11/2026	1

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

Attività lavorative		Importo	Quantità	%MO	O	Inizio - Fine	Durata
46	A.P.22 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi t.....er chiuso in ghisa sino a dimensioni 50x50 cm.	140,32 €	4,00	45,27%	4	03/11/2026 - 04/11/2026	2
47	A.P.09 Rimozione di chiusini in ghisa e dei relativi t.....er chiuso in ghisa sino a dimensioni 40x40 cm.	131,60 €	5,00	45,27%	4	03/11/2026 - 04/11/2026	2
48	A.P.15 Rimozione di pavimentazione in autobloccanti, c.....a rifiuto, quest'ultimo compensato a parte.	439,20 €	45,00	45,27%	4	03/11/2026 - 04/11/2026	2
49	SIC24_18.01.02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anch.....apos; opera finita a perfetta regola d'arte.	67,73 €	0,50	45,27%	4	05/11/2026 - 06/11/2026	2
50	SIC24_21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.				4	09/11/2026 - 09/11/2026	1
51	A.P.08 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e.....cm 65x65 o caditoie sono a dimensioni cm 100x30.	166,65 €	5,00	45,27%	4	09/11/2026 - 10/11/2026	2
52	SIC24_03.01.18 Calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base ano giunti - Modulo plastico a 28 gg: 15.000 MPa	173,32 €	0,60	45,27%	4	06/11/2026 - 07/11/2026	2
53	A.P.08 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e.....cm 65x65 o caditoie sono a dimensioni cm 100x30.	133,32 €	4,00	45,27%	4	09/11/2026 - 10/11/2026	2
54	A.P.08 Lavori di messa in quota di chiusini, griglie e.....cm 65x65 o caditoie sono a dimensioni cm 100x30.	133,32 €	4,00	45,27%	4	09/11/2026 - 10/11/2026	2
55	A.P.16 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vi.....ulometria controllata compresa tra 0,3 e 2,0 mm.	1.911,42 €	42,00	45,27%	4	11/11/2026 - 13/11/2026	3
56	A.P.28 Lavori di assistenza muraria e/o di preparazion..... della pavimentazione dell'area interessata	654,90 €	10,00	45,27%	4	13/11/2026 - 14/11/2026	2
57	A.P.17 Fornitura e posa di pavimento in PVC realizzata.....s; opera completa a perfetta regola d'arte.	1.460,31 €	26,78	45,27%	4	16/11/2026 - 17/11/2026	2
58	A.P.14 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbr.....ne ad esclusione dello scavo compensato a parte.	306,72 €	2,00	45,27%	4	14/11/2026 - 14/11/2026	1
59	A.P.10 Fornitura e posa in opera di chiuso con telai.....e il chiuso posto in opera. Misure cm 40x40x8.	839,40 €	5,00	45,27%	4	17/11/2026 - 17/11/2026	1
60	A.P.11 Fornitura e posa in opera di chiuso con telai.....il chiuso posto in opera. Misure cm 50x50x5-8.	608,64 €	4,00	45,27%	4	17/11/2026 - 17/11/2026	1
61	A.P.02 Fornitura e posa in opera di profili in allumin.....amento rettilineo e per altezza di sino a 20 mm.	2.857,50 €	137,38	45,27%	4	18/11/2026 - 21/11/2026	4
62	A.P.21 Fornitura e posa in opera di pavimentazione dre.....on colorazione a scelta insindacabile della D.L.	45.108,28 €	220,87	45,27%	4	23/11/2026 - 04/12/2026	12
63	A.P.01 Ripristino di pavimenti in masselli autobloccan.....izia con raccolta ed allontanamento dei detriti.	212,70 €	10,00	45,27%	4	30/11/2026 - 30/11/2026	1
64	A.P.19 Lavori di preparazione e pulitura delle superfi....., pronta per accogliere lo strato di antiruggine.	9,53 €	2,28	45,27%	4	30/11/2026 - 30/11/2026	1
65	A.P.20 Fornitura e posa in opera di fondo antiruggine reparazione del supporto, da compensare a parte.	30,64 €	2,28	45,27%	4	30/11/2026 - 30/11/2026	1
66	A.P.18	729,89 €	38,68	45,27%	4	30/11/2026 - 03/12/2026	4

Progetto per la riqualificazione delle aree esterne al plesso Maglia dell'I.C. Federico De Rob di Zafferana Etnea per la realizzazione di campo da gioco esterno e spazi per attività ludica e motoria

	Attività lavorative	Importo	Quantità	%MO	O	Inizio - Fine	Durata
	Fornitura e applicazione di vernice poliuretani.....er dare il lavoro completo a regola d'arte.						
67	SIC24_19.07.02 Fornitura e posa in opera di geotessile non tes..... sovrapposizioni. - per m² di superficie coperta	278,32 €	56,00	45,27%	4	03/12/2026 - 03/12/2026	1
68	A.P.26 Formazione del piano di posa alla pavimentazion..... non interessata dallo scavo e per mq di lavoro.	1.133,05 €	85,00	45,27%	4	03/12/2026 - 03/12/2026	1
69	A.P.24 Fornitura e posa in opera di bordura per giardi.....positi picchetti in plastica inclusi nel costo.	364,00 €	52,00	45,27%	4	04/12/2026 - 04/12/2026	1
70	A.P.27 Fornitura e posa in opera di ghiaietto con gran..... fasce di separazione in pvc compensate a parte.	3.456,10 €	85,00	45,27%	4	04/12/2026 - 05/12/2026	2
71	A.P.25 Fornitura e posa in opera di pavimento antitrau.....os; opera completa a perfetta regola d'arte.	3.423,28 €	56,00	45,27%	4	07/12/2026 - 09/12/2026	3
72	SIC24_11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,.....l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	2.914,02 €	125,93	45,27%	4	30/11/2026 - 09/12/2026	10
73	SIC24_11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,.....l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	1.879,89 €	81,24	45,27%	4	06/12/2026 - 09/12/2026	4
74	SIC24_11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili,.....l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	3.649,64 €	157,72	45,27%	4	06/12/2026 - 09/12/2026	4

